

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULARIO EN LA UNIVERSIDAD ES, IATL DE MILAGRO" CURVA DE INVERSION


CONTRATISTA: HORMICOPEC CIA. LTDA.
FECHA INICIO OBRA: 17 DE AGOSTO DEL 2019
MONTO CONTRATO : \$ 2.605.871,43
MONTO EVALUADO : \$ 2.817.810,84
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2019


PLAZO CONTRACTUAL: 120 días
AMPLIACION DE PLAZO N° 3: 89 días
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE AGOSTO DEL 2019

AVANCE DE OBRA

PERIODO	18-08 a 23-08 6 días	12-10 a 31-10 20 días	01-01 a 31-01 30 días	01-04 a 30-04 30 días	01-05 a 31-05 31 días	01-06 a 30-06 30 días	01-07 a 31-07 31 días	01-08 a 31-08 31 días
INVERSION PARCIAL MENSUAL	\$ 2.983,00	\$ 76.431,85	\$ 360.099,92	\$ 52.547,99	\$ 175.519,59	\$ 706.808,42	\$ 715.125,39	\$ 728.267,69
INVERSION PARCIAL EN %	0,11%	2,71%	12,78%	1,86%	6,23%	25,08%	25,38%	25,85%
INVERSION MENSUAL ACUMULADO	\$ 2.983,00	\$ 79.414,85	\$ 439.514,77	\$ 492.062,76	\$ 667.582,35	\$ 1.374.390,77	\$ 2.089.516,16	\$ 2.817.783,85
INVERSION PARCIAL EJECUTADO	\$ 2.983,00	\$ 76.431,85	\$ 293.376,71	\$ 52.904,61	\$ 119.505,69	\$ 51.898,22	\$ 153.432,13	\$ 2.817.783,85
INVERSION ACUMULADO EJECUTADO	\$ 2.983,00	\$ 79.414,85	\$ 372.791,56	\$ 425.696,17	\$ 445.201,76	\$ 497.099,98	\$ 650.532,11	\$ 2.817.783,85
Avance programado Acumulado %	0,11%	2,82%	10,41%	1,88%	0,69%	1,84%	5,45%	0,00%
Avance planillado Acumulado %	0,11%	2,82%	13,23%	15,11%	23,69%	48,78%	74,15%	100,00%
PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	

Curva de avance

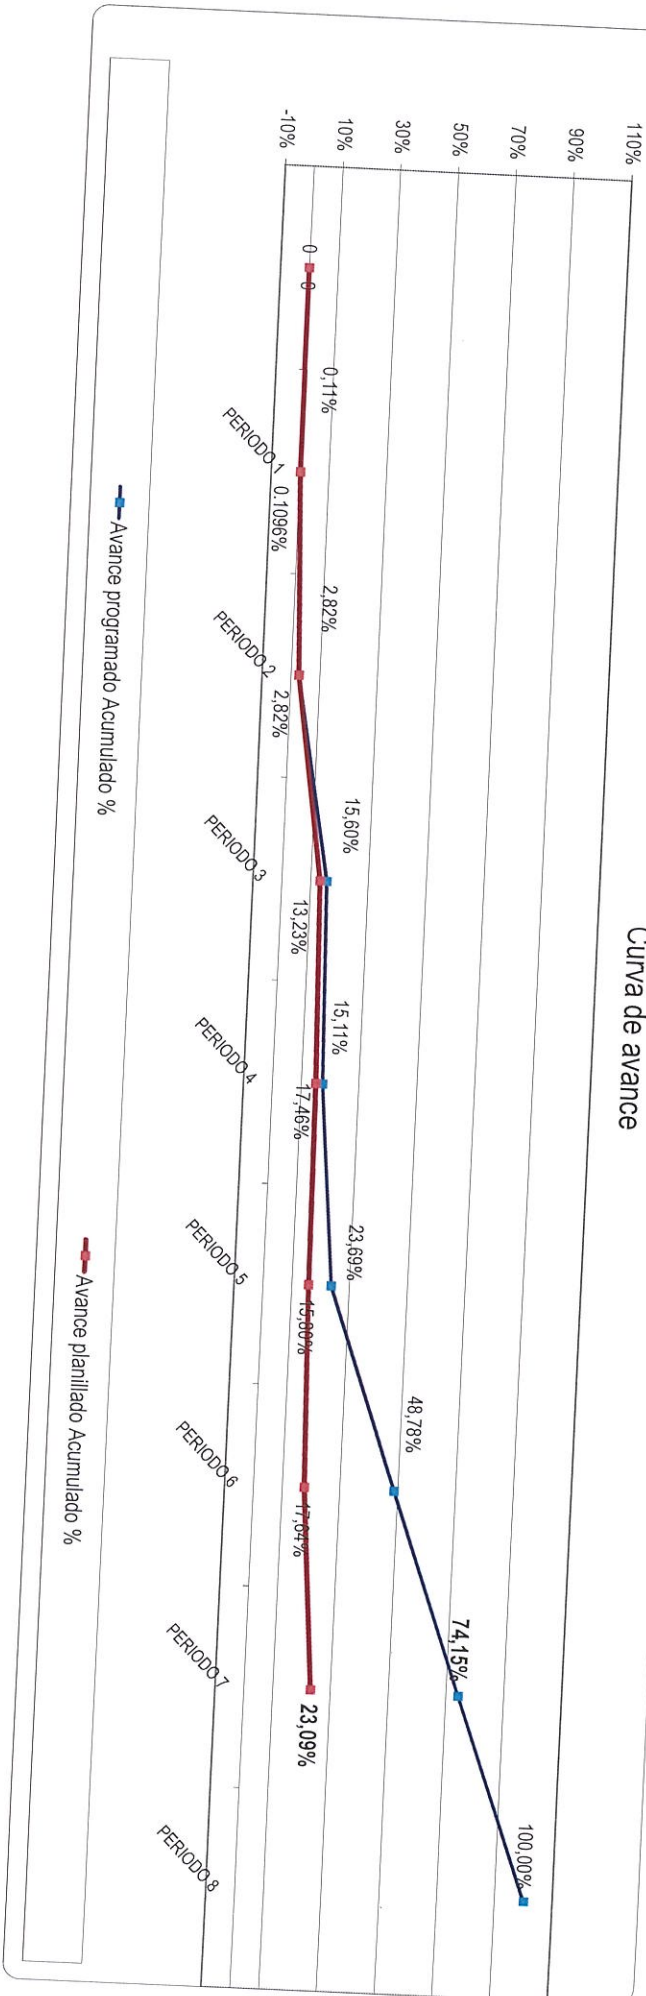


ING. CARLOS PEÑA OCHOA
 GERENTE GENERAL POLICONSTRUC S.A.
 FISCAL 172000011
